TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN DỰ ÁN XÂY DỰNG TUYẾN TRÁNH THÀNH PHỐ ĐÀ LẠT ĐOẠN TỪ CHÂN ĐÈO PRENN ĐẾN XÃ XUÂN THỌ

ID	STT	NỘI DUNG CÔNG VIỆC	THỜI LƯỢNG THỰC HIỆN	NGÀY BẮT ĐẦU	NGÀY HOÀN THÀNH	CƠ QUAN CHỦ TRÌ	CƠ QUAN PHỐI HỢP	CHI CHÚ
1		**TỔNG THỜI GIAN KẾ HOẠCH THỰC HIỆN DỰ ÁN**	**487 days**	**10/08/2025**	**10/12/2026**			
2		**Bước chuẩn bị dự án**	**288 days**	**10/08/2025**	**25/05/2026**			
3		**Lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư**	**268 days**	**10/08/2025**	**05/05/2026**			
4		Lập và trình phê duyệt dự toán các chi phí chuẩn bị đầu tư dự án	6 days	18/09/2025	23/09/2025	Ban QLDA		
5		Lập hồ sơ đề cương nhiệm vụ lập chủ trương đầu tư	5 days	24/09/2025	28/09/2025	Ban QLDA		
6		Phê duyệt sơ đề cương nhiệm vụ lập chủ trương đầu tư, hồ sơ rừng và ĐTM và 1 phần kế hoạch lựa chọn nhà thầu	3 days	29/09/2025	01/10/2025	Ban QLDA		
7		Lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Dự án	268 days	10/08/2025	05/05/2026			Điều chỉnh sau buổi kiểm tra hiện trường của UBND tỉnh tại Thông báo số 129 TB UBND ngày 10/8/2025
8		Trình Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án	1 day	10/08/2025	10/08/2025			
9		Thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án	60 days	11/08/2025	10/10/2025			
10		**Quyết định phê duyệt Chủ trương đầu tư dự án**	**10 days**	**11/10/2025**	**20/10/2025**			
11		Hồ sơ chuyển đổi mục đích sử dụng rừng	42 days	21/10/2025	01/12/2025			
12		Lập phê duyệt đề cương và 1 phần kế hoạch lựa chọn nhà thầu	3 days	21/10/2025	23/10/2025			
13		Lựa chọn nhà thầu lập hồ sơ chuyển đổi mục đích sử dụng rừng	2 days	24/10/2025	25/10/2025			
14		Lập, trình hồ sơ chuyển đổi mục đích sử dụng rừng	30 days	26/10/2025	24/11/2025			
15		Văn bản thẩm định hồ sơ chuyển đổi mục đích sử dụng rừng	7 days	25/11/2025	01/12/2025			
16		Hồ sơ ĐTM	39 days	21/10/2025	28/11/2025			
17		Lập phê duyệt đề cương và 1 phần kế hoạch lựa chọn nhà thầu	3 days	21/10/2025	23/10/2025			
18		Lựa chọn nhà thầu lập hồ sơ ĐTM	1 day	24/10/2025	24/10/2025			
19		Lập hồ sơ ĐTM	30 days	25/10/2025	23/11/2025			
20		**Quyết định phê duyệt chủ trương Chuyển mục đích sử dụng rừng**	**5 days**	**24/11/2025**	**28/11/2025**			
21		Lựa chọn nhà thầu lập BC NCKT dự án, thiết kế cắm cọc GPMB	92 days	21/10/2025	20/01/2026			
22		Lập đề cương nhiệm vụ - dự toán Gói thầu khảo sát - Lập BC NCKT dự án (Tư vấn lập đề cương nhiệm vụ) - và 1 phần KHLCNT	10 days	21/10/2025	30/10/2025	Tư vấn	P.ĐHDA GT	
23		Trình, thẩm định đề cương nhiệm vụ - dự toán Gói thầu Lập BCNCKT dự án	15 days	31/10/2025	14/11/2025	P.ĐHDA GT	P.KTQLCL	
24		Trình 1 phần KHLCNT	15 days	15/11/2025	29/11/2025	P.ĐHDA GT		
25		Phê duyệt đề cương nhiệm vụ - dự toán Gói thầu Lập BCNCKT	1 day	30/11/2025	30/11/2025	Ban QLDA ĐTXD số 1		
26		Phê duyệt 1 phần KHLCNT	1 day	01/12/2025	01/12/2025			
27		Tổ chức lựa chọn nhà thầu tư vấn Khảo sát - Lập hồ sơ BCNCKT dự án	30 days	02/12/2025	31/12/2025	Ban QLDA ĐTXD số 1		
28		Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Khảo sát - Lập BCNCKT dự án	10 days	01/01/2026	10/01/2026	Ban QLDA ĐTXD số 1		
29		Ký hợp đồng lập BCNCKT dự án	10 days	11/01/2026	20/01/2026	Ban QLDA ĐTXD số 1	Đơn vị tư vấn	
30		Thực hiện gói thầu tư vấn Khảo sát - Lập BCNCKT dự án, thiết kế cắm cọc GPMB	125 days	21/01/2026	25/05/2026			
31		Tư vấn trình phương án khảo sát bước lập BCNCKT	1 day	21/01/2026	21/01/2026	Đơn vị tư vấn		
32		Phê duyệt phương án Khảo sát	10 days	22/01/2026	31/01/2026	Ban QLDA ĐTXD số 1	Đơn vị tư vấn	
33		Tư vấn tổ chức Khảo sát - Lập BC NCKT dự án	10 days	01/02/2026	10/02/2026	Đơn vị tư vấn		
34		Phối hợp với đơn vị tư vấn hoàn thiện hồ sơ BCNCKT dự án	10 days	11/02/2026	20/02/2026	P.ĐHDA GT	P.KTQLCL	
35		Trình hồ sơ BCNCKT dự án và hồ sơ thiết kế cắm cọc GPMB	15 days	21/02/2026	07/03/2026	P.ĐHDA GT	P.KTQLCL	
36		Thẩm định BCNCKT dự án và hồ sơ thiết kế cắm cọc GPMB	30 days	08/03/2026	06/04/2026	Sở Xây dựng		
37		***Phê duyệt BCNCKT dự án (Ban hành Quyết định phê duyệt dự án)***	***1 day***	***07/04/2026***	***07/04/2026***	***UBND tỉnh***		
38		Phê duyệt hồ sơ thiết kế cắm cọc GPMB	1 day	08/04/2026	08/04/2026	Ban QLDA ĐTXD số 1		
39		Tư vấn tổ chức cắm cọc GPMB	30 days	09/04/2026	08/05/2026	Đơn vị tư vấn		
40		Nghiệm thu cắm cọc GPMB	5 days	09/05/2026	13/05/2026	Ban QLDA ĐTXD số 1	Đơn vị tư vấn	
41		Tổ chức bàn giao cọc GPMB cho xã phường	2 days	14/05/2026	15/05/2026	Ban QLDA ĐTXD số 1	UBND xã, phường	
42		Nghiệm thu, thanh toán Gói thầu Lập BCNCKT dự án, thiết kế - cắm cọc GPMB	10 days	16/05/2026	25/05/2026	Ban QLDA ĐTXD số 1		
43		Bước Thực hiện dự án	211 days	14/05/2026	10/12/2026			
44		Lựa chọn nhà thầu TK BVTC	59 days	26/05/2026	23/07/2026			

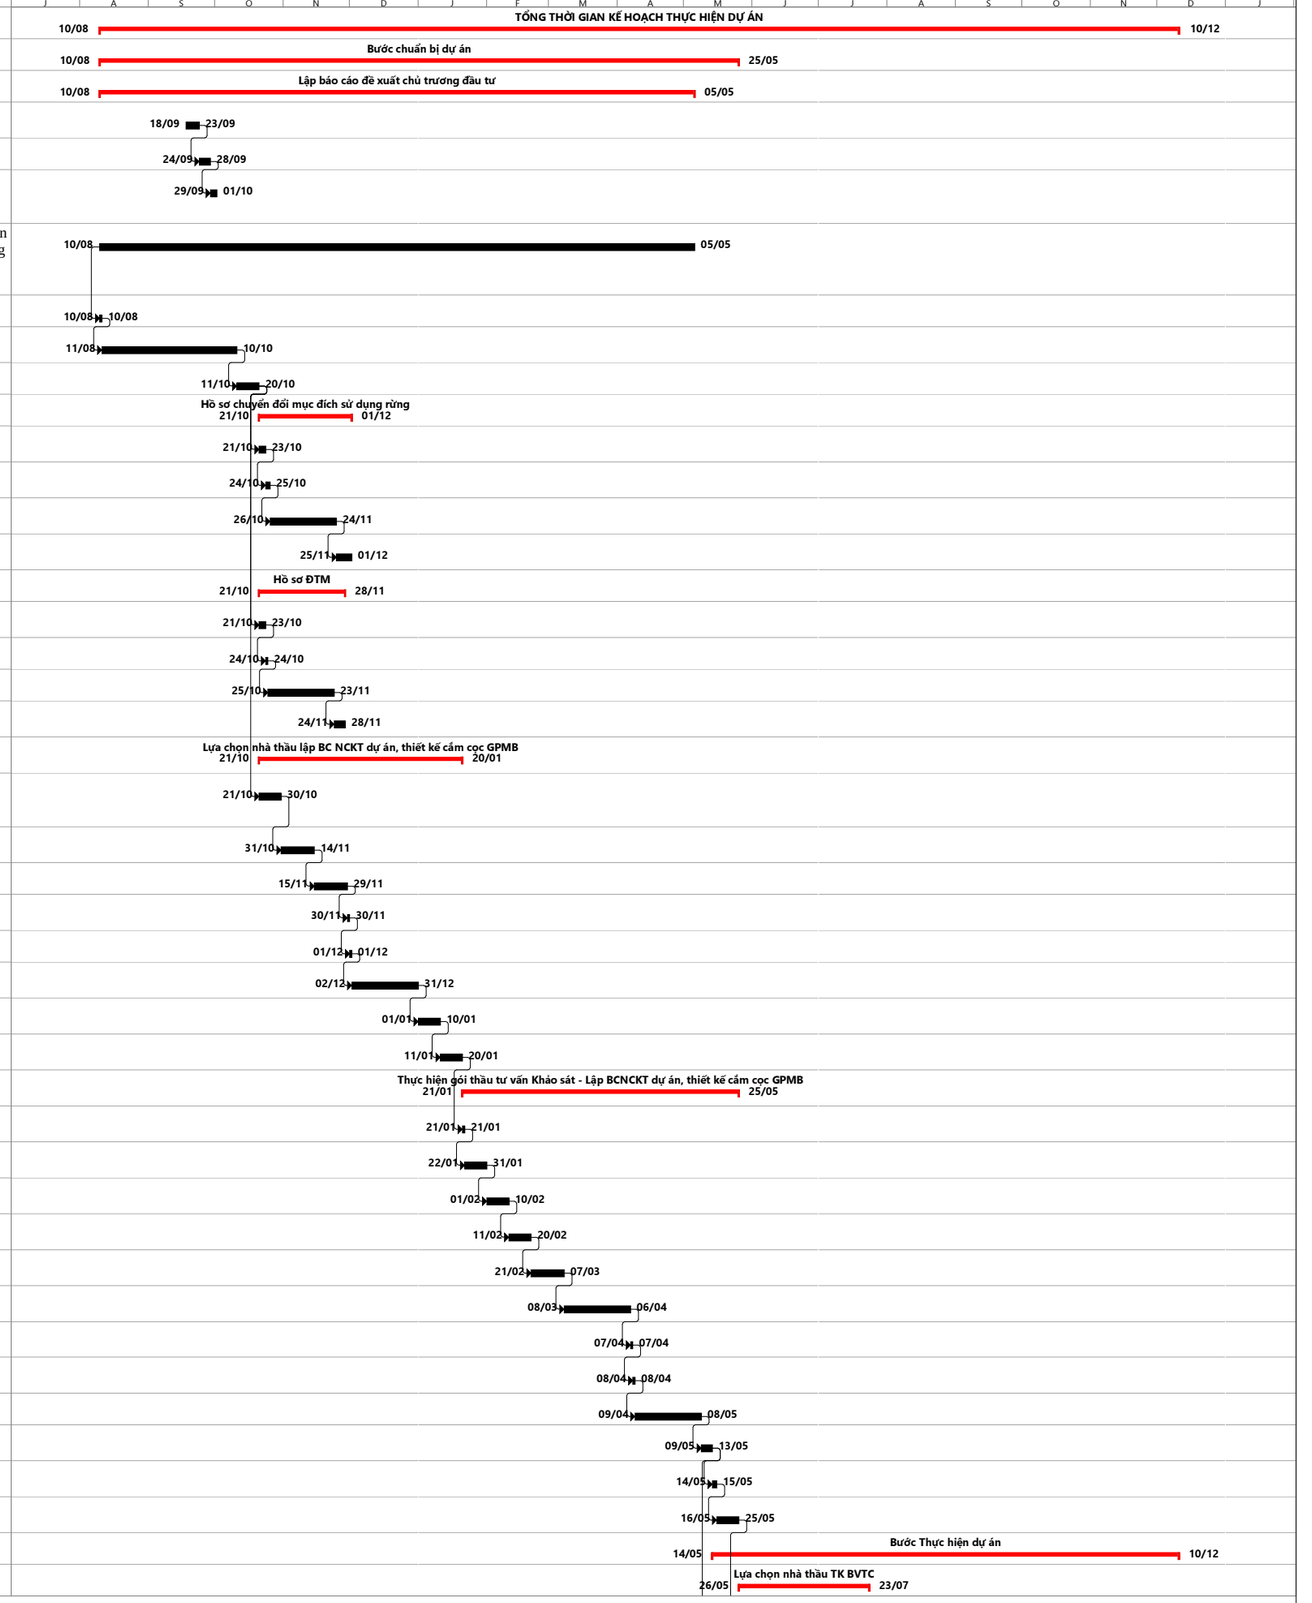

TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN DỰ ÁN XÂY DỰNG TUYẾN TRÁNH THÀNH PHỐ ĐÀ LẠT ĐOẠN TỪ CHÂN ĐÈO PRENN ĐẾN XÃ XUÂN THỌ
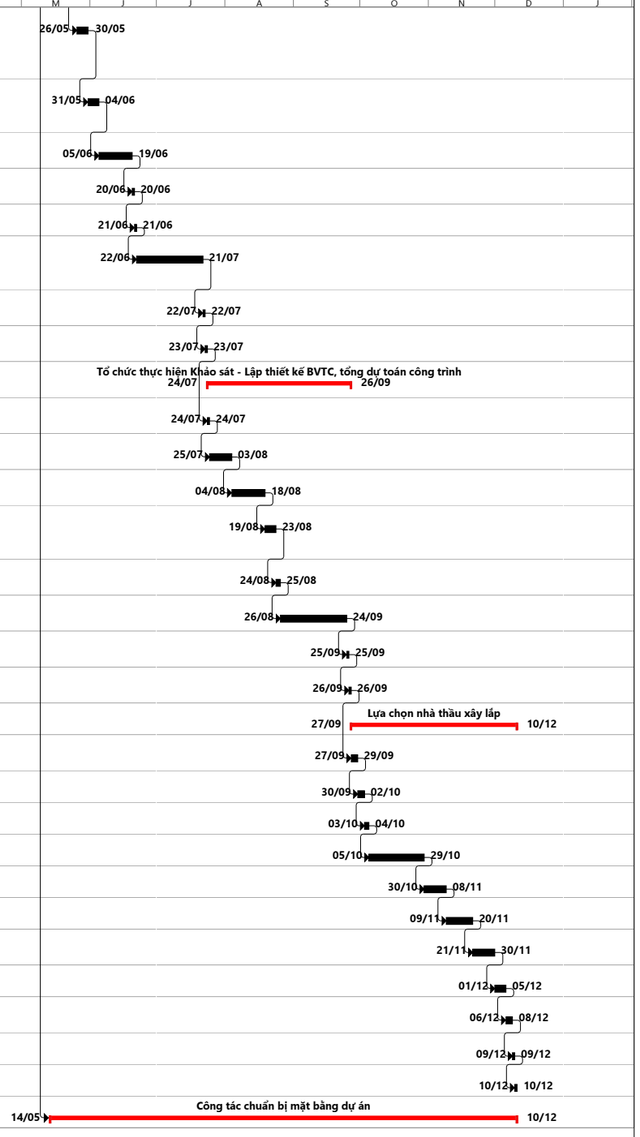
ID	STT	NỘI DUNG CÔNG VIỆC	THỜI LƯỢNG THỰC HIỆN	NGÀY BẮT ĐẦU	NGÀY HOÀN THÀNH	CƠ QUAN CHỦ TRÌ	CƠ QUAN PHỐI HỢP	CHI CHÚ
45		Lập đề cương nhiệm vụ - dự toán Gói thầu Khảo sát - Lập thiết kế BVTC, tổng dự toán công trình (chỉ định Tư vấn lập đề cương nhiệm vụ) - và bổ sung 1 phần KHLCNT	5 days	26/05/2026	30/05/2026	P.ĐHDA GT		
46		Trình, thẩm định đề cương nhiệm vụ - dự toán Gói thầu Khảo sát - Lập thiết kế BVTC, tổng dự toán công trình	5 days	31/05/2026	04/06/2026	P.ĐHDA GT		
47		Trình bổ sung 1 phần KHLCNT (trình Sở Tài chính và UBND tỉnh)	15 days	05/06/2026	19/06/2026	P.ĐHDA GT	P.KTQLCL	
48		Phê duyệt đề cương nhiệm vụ - dự toán Gói thầu Thiết kế BVTC	1 day	20/06/2026	20/06/2026	Ban QLDA ĐTXD số 1		
49		Phê duyệt 1 phần kế hoạch đấu thầu	1 day	21/06/2026	21/06/2026	UBND tỉnh		
50		Tổ chức đấu thầu lựa chọn đơn vị tư vấn Khảo sát - Lập thiết kế BVTC, tổng dự toán công trình	30 days	22/06/2026	21/07/2026	Ban QLDA ĐTXD số 1	P.TCKH	
51		Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Khảo sát - Lập thiết kế BVTC, tổng dự toán công trình	1 day	22/07/2026	22/07/2026	Ban QLDA ĐTXD số 1		
52		Ký hợp đồng Gói thầu tư vấn Khảo sát - Lập thiết kế BVTC, tổng dự toán công trình	1 day	23/07/2026	23/07/2026	Ban QLDA ĐTXD số 1	P.TCKH	
53		Tổ chức thực hiện Khảo sát - Lập thiết kế BVTC, tổng dự toán công trình	65 days	24/07/2026	26/09/2026			
54		Tư vấn trình phương án khảo sát bước lập thiết kế BVTC	1 day	24/07/2026	24/07/2026	Tư vấn		
55		Phê duyệt phương án Khảo sát	10 days	25/07/2026	03/08/2026	Ban QLDA ĐTXD số 1		
56		Tư vấn tổ chức Khảo sát - Lập thiết kế BVTC, tổng dự toán công trình	15 days	04/08/2026	18/08/2026	Tư vấn		
57		Phối hợp với đơn vị tư vấn hoàn thiện hồ sơ Khảo sát - Lập thiết kế BVTC, tổng dự toán công trình	5 days	19/08/2026	23/08/2026	P.ĐHDA GT		
58		Trình hồ sơ Khảo sát - Lập thiết kế BVTC, tổng dự toán công trình	2 days	24/08/2026	25/08/2026	P.ĐHDA GT		
59		Thẩm định hồ sơ Khảo sát - Lập thiết kế BVTC, tổng dự toán công trình	30 days	26/08/2026	24/09/2026	P.TCKH		
60		Phê duyệt hồ sơ Khảo sát - Lập thiết kế BVTC, tổng dự toán công trình	1 day	25/09/2026	25/09/2026	Ban QLDA ĐTXD số 1		
61		Nghiệm thu, thanh toán Gói thầu Khảo sát - Lập thiết kế BVTC, tổng dự toán công trình	1 day	26/09/2026	26/09/2026	Ban QLDA ĐTXD số 1		
62		**Lựa chọn nhà thầu xây lắp**	**75 days**	**27/09/2026**	**10/12/2026**			
63		Chỉ định thầu nhà thầu lập hồ sơ thầu, tổ chức đấu thầu	3 days	27/09/2026	29/09/2026			
64		Tư vấn lập hồ sơ mời thầu	3 days	30/09/2026	02/10/2026	Tư vấn		
65		Phê duyệt hồ sơ mời thầu	2 days	03/10/2026	04/10/2026	Tư vấn		
66		Tư vấn thông báo, phát hành hồ sơ mời thầu	25 days	05/10/2026	29/10/2026	Tư vấn		
67		Tư vấn tổ chức xét thầu bước kỹ thuật	10 days	30/10/2026	08/11/2026	Tư vấn		
68		Thẩm định phê duyệt bước kỹ thuật gói thầu	12 days	09/11/2026	20/11/2026	Ban QLDA		
69		Mở gói tài chính, xét và trình kết quả lựa chọn nhà thầu	10 days	21/11/2026	30/11/2026	Tư vấn		
70		Thương thảo ký kết hợp đồng	5 days	01/12/2026	05/12/2026	Tư vấn		
71		Ban QLDA thẩm định, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu	3 days	06/12/2026	08/12/2026	Ban QLDA		
72		Ký hợp đồng xây lắp	1 day	09/12/2026	09/12/2026	Ban QLDA		
73		**Khởi công công trình**	**1 day**	**10/12/2026**	**10/12/2026**			
74		Công tác chuẩn bị mặt bằng dự án	211 days	14/05/2026	10/12/2026
